


Hringbrautarverkefnið – staða framkvæmda

- Hverfisvernd á Alaskareit
- Vinna við undirbúning undir malbikun gengur vel á vinnubúðareit
- Stór verkefni fram undan hjá Hönnunarsviði NLSH
- Framkvæmdir við bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu
- Framkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg
- Lokafrágangur sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala

Hverfisvernd á Alaskareit

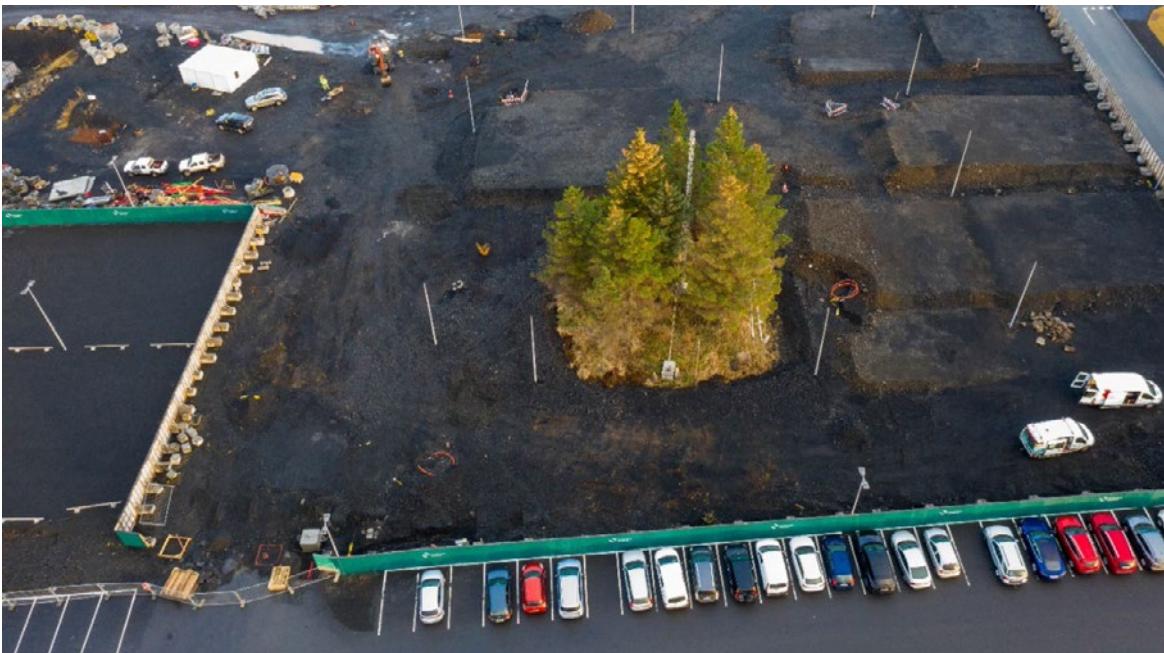

Yfirlitsmynd, trjálundurinn á vinnubúðareitnum séð til norðurs

Vinnubúðareitur Hringbrautarverkefnisins er hverfisverndaður í samþykktu deiliskipulagi þ.e. sá hluti reitsins sem grenitrén eru á. NLSH hefur lagt mikla áherslu á að þegar tré eru feld og lagfærð að allt sé gert með réttum hætti en laga hefur þurft trjálundinn til. Verið hefur haft samráð við Garðyrkjustjóra Reykjavíkurborgar og ýmsa aðra sérfróða aðila, en embættið hefur sýnt verkinu mikinn áhuga. Þess má geta að trjálundurinn stendur þar sem gróðrarstöðin Alaska stóð á sínum tíma þaðan sem fjölmargir landsmenn eiga góðar minningar.

(Sjá nr. 1 á korti)

Vinna við undirbúnning undir malbikun gengur vel á vinnubúðareit



Yfirlitsmynd, vinnubúðareitur þar sem reistar verða vinnubúðir úr gámaeiningu vegna uppsteypu á nýum meðferðarkjarna, séð til suðurs

Læknagarður austan við svæðið og nýjar byggingar við Hlíðarenda sunnan við



Unnið er við að hefla og jafna jarðveg undir malbikun



Verið er að fylla í efni á vinnubúðasvæðinu

Jarðvegsframkvæmdir á vinnubúðareit ganga vel og búið er að grafa fyrir og setja upp ljósastaura. Lagnavinnu er lokið á svæðinu.

Á vinnubúðareit verða reistar framtíðarvinnubúðir úr gámaeiningum fyrir verktaka, hönnuði og verkkaupa og einnig verður þar efnislager og aðstaða fyrir sameiginlegt móttuneyti starfsmanna við uppsteypuverkefnið á nýjum meðferðarkjarna.

Verið er að jafna undir eftir undirlag, hækka brunna og ganga frá niðurföllum og að klára götuna í rétta hæð áður en malbikað verður í næstu viku.

Eftir er að setja upp safntank við Vatnsmýraveg og setja upp girðingar í kringum vinnubúðareitinn þegar malbikun klárást.

Einnig er verið að slá upp mótmug vegna steypuvinnu við undirstöður fyrir aðgangshlið, bæði fyrir gangandi og akandi aðila sem þurfa að komast inn á svæðið vegna vinnu sinnar.

Verklok eru áætluð í lok nóvember.

(Sjá nr. 2 á korti)

Stór verkefni fram undan hjá Hönnunarsviði NLSH



Starfsmenn hönnunarsviðs NLSH skipuleggja verkefnin fram undan

Starfsmenn Hönnunarsviðs NLSH vinna þessa daga við fjölmög verkefni vegna hönnunar bygginga í Hringbrautarverkefninu en því sviði veitir forstöðu Sigríður Sigurðardóttir.

„Hjá okkur stendur yfir skipulagning á starfi okkar á Hönnunarsviðinu á komandi vetri. Stærstu verkefnin okkar á næstu mánuðum eru hönnunarverkefni vegna hönnunar á nýjum meðferðarkjarna og á rannsóknahúsi. Vinna við hönnun á meðferðarkjarnanum (nýju sjúkrahúsi) er langt komin og samhlíða þeirri vinnu er unnið að hönnun á nýju rannsóknahúsi þar sem öll rannsóknastarfsemi Landspítalans verður sameinuð á einum stað.

Hönnun meðferðarkjarnans mun ljúka með vorinu og stefnt er að því að hönnun á nýju rannsóknahúsi ljúki í lok árs 2021,“ segir Sigríður.

Í undirbúningi eru alútboðsgögn fyrir Bílastæða- og tæknihús en gert er ráð fyrir að hönnun þess hefjist á næstu mánuðum.

Framkvæmdir við bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu



Unnið er að undirbúningi áður en sett verða upp handrið við Kringlu á lóð Landspítala

Vinna heldur áfram við að setja upp handrið við bílastæðið sunnan við Kringlu og meðfram gönguleiðinni sunnan við gamla spítala. Verktaki hefur verið að stilla af handlista áður en þeir fara í yfirborðsmeðhöndlun.

Verklok eru áætluð í nóvember.

(Sjá nr. 3 á korti)

Framkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg



Uppsetning handriða vestan við Eirberg

Áfram er unnið við uppsetningu á handriðum vestan við Eirberg og að því loknu verður hellulögn kláruð og gengið frá tröppum.

Áætlað er að þessum framkvæmdum ljúki í lok nóvember.
(Sjá nr. 4 á korti)

Lokafrágangur sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala



Lokafrágangur stendur yfir við geðdeildarbyggingu Landspítala

Eftir á að ganga frá vinnu við trjábeð við geðdeild Landspítala en öðrum verkum á þessu svæði er lokið.

Áætlað er að þessari framkvæmd ljúki í nóvember.
(Sjá nr. 5 á korti)

Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldiðum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH, 866 1378 eða magnus@nlsh.is

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 stefanh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
