



## Hringbrautarverkefnið – staða framkvæmda

- Vinna við yfirborðsfrágang sunnan og vestan við Eirberg
- Lokafrágangur við ný bílastæði sunnan við geðdeild Landspítala
- Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg nánast lokið
- Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjum meðferðarkjarna á lokastigi
- Frágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg
- Frágangur við bílastæði við vesturgafi gamla Landspítala
- Varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans

## Vinna við yfirborðsfrágang sunnan og vestan við Eirberg



Unnið við hellulagningu og við kantsteinagerð sunnan við Eirberg, séð til vesturs



Framkvæmdasvæðið við vestur og suðurhlíð Eirbergs, séð til austurs



Verið er að leggja kantsteina sunnan við Eirberg

Jarðvegsframkvæmdum sunnan og vestan við Eirberg er lokið.

Nú er unnið við frágang yfirborðs, lagningu á snjóbræðslu, hellulögn og tröppur. Bílastæði hefur verið malbikað og bílastæðalínur málaðar.

Unnið er við að helluleggja gönguleið á milli geðdeildarbyggingar og Eirbergs. Gönguleiðin er með snjóbræðslu.

Tröppur frá bílastæði að Eirbergi verða gerðar og lögð snjóbræðsla.

Ekki er gert ráð fyrir að bifreiðum sé lagt við girðinguna sem nær að inngangi geðdeildar.

Áætlað er að þessum framkvæmdum ljúki í maí.

**(Sjá nr. 1 á korti)**

## Lokafrágangur við ný bílastæði sunnan við geðdeildarbyggingu



Við geðdeildarbyggingu Landspítala er unnið við að leggja snjóbræðslu og við hellulögn

Malbikuð hafa verið ný bílastæði sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala. Unnið er að frágangi við bílastæðin m.a. við að leggja snjóbræðslu og við hellulögn. Bílastæði fyrir hreyfihamlaða verða stækkuð og aðgengi að svæði við geðdeildarbyggingu bætt.

Verklok eru áætluð í lok maí.

**(Sjá nr. 2 á korti)**

## Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg nánast lokið



Framkvæmdir við grunn bílakjallara eru á lokastigi, séð til norðurs



Grunnur bílakjallara, séð til austurs

Jarðvinnu við grunn bílakjallara er nánast lokið og verið er að moka lausefni úr grunninum. Bílakjallarinn verður staðsettur undir Sóleyjartorgi austan við meðferðarkjarna. Búið er að losa um 99% af heildarmagni efnis fyrir meðferðarkjarna og bílakjallara. Áætlað er að jarðvegsframkvæmdum vegna bílakjallara ljúki í byrjun maí.

**(Sjá nr. 3 á korti)**

## Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna á lokastigi



Grunnur meðferðarkjarna, séð til austurs



Yfirlitsmynd, grunnur meðferðarkjarna séð til vesturs

Vinna við grunn nýs meðferðarkjarna hefur gengið vel og er nánast lokið. Verklök eru áætluð í maí og unnið er við hreinsun og frágang á grunninum. Öll umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið er vaktuð til að auka öryggi vegfarenda.

**(Sjá nr. 4 á korti)**

## Frágangur við bílastæði norðan við Eirberg



Búið er að steypa kantsteina og eftir er að helluleggja við eyjur norðan við Eirberg

Vinna heldur áfram við frágang við bílastæði norðan við Eirberg. Búið er að steypa kantsteina og unnið verður við hellulagðar eyjar og við annan frágang.

Bílastæðin verða merkt samkvæmt nýju skipulagi.

Stæðin eru gjaldskyld og eru ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra.

**(Sjá nr. 5 á korti)**

## Frágangur við bílastæði við vesturgafli gamla Landspítala



Vinna er hafin við frágang við bílastæði við gamla spítala



Verið að fylla að efni vegna framkvæmda við gamla spítala

Vinna er hafin við frágang við bílastæði við vesturgafli gamla Spítala. Svæðið verður hellulagt og sett í snjóbræðsla í tröppur og gönguleið frá bílastæði að gamla spítala. Bílastæðin hafa verið tekin í notkun og eru ætluð fyrir gesti spítalans og eru gjaldskyld. Stefnt er að því að verkið klárast í maí.

**(Sjá nr. 6 á korti)**

## Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans




Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans. Akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en öikumönnum er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.

Akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.

**(Sjá nr. 7 á korti)**

# Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir

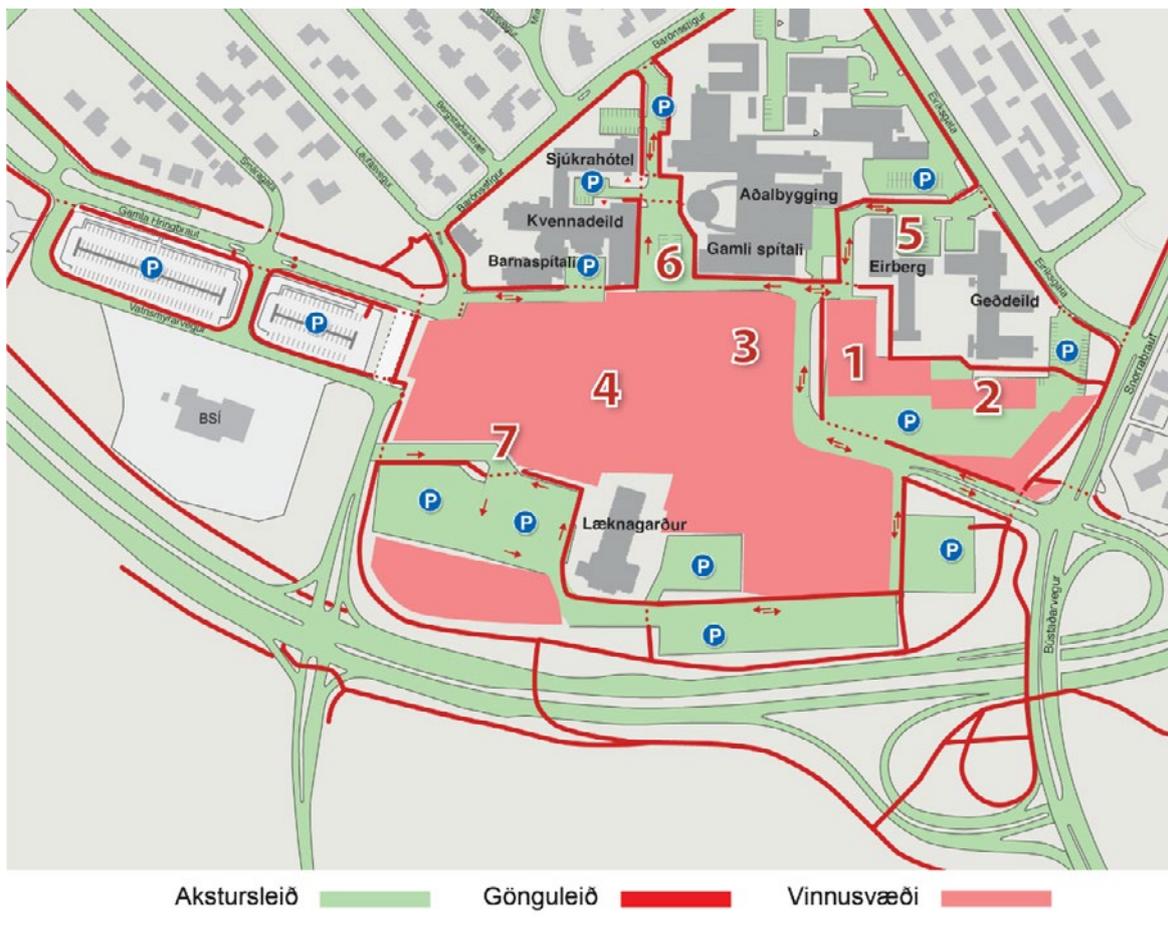

## Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjölmiðlum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið [asbjorn@nlsh.is](mailto:asbjorn@nlsh.is)

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,

866 1378 eða [magnus@nlsh.is](mailto:magnus@nlsh.is)

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644

[stefanhh@landspitali.is](mailto:stefanhh@landspitali.is) og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 [bgisla@hi.is](mailto:bgisla@hi.is)



Hringbrautar  
verkefnið

[nlsh.is](http://nlsh.is)

NLSH ohf. / Skúlagata 21, 101 Reykjavík / Aðalnúmer 551 6010 / kt. 500810-0410 / [postur@nlsh.is](mailto:postur@nlsh.is)
