

Hringbrautarverkefnið – staða framkvæmda

- Heilbrigðisráðherra viðstödd síðustu táknrænu sprenginguna í grunni við nýjan Landspítala, uppsteypa hefst von bráðar
- Ráðgjafarnefnd Landspítala skoðar framkvæmdasvæði nýs Landspítala
- Framkvæmdir við bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu
- Framkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg
- Frágangur sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala
- Lokaáfangi jarðvinnu vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg
- Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjum meðferðarkjarna nær lokið
- Frágangur við bílastæði norðan við Eirberg
- Frágangur við bílastæði vestan við Gamla Landspítala
- Vinnusvæði meðferðarkjarnans, gæta skal varúðar við akstur

Heilbrigðisráðherra viðstödd síðustu táknrænu sprenginguna í grunni við nýjan Landspítala, uppsteypa hefst von bráðar



Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, setur af stað sprenginguna ásamt Ómari Kristjánssyni hjá ÍAV



Sprenging í grunni meðferðarkjarnans



Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, ásamt Páli Matthíassyni, forstjóra Landspítala, voru viðstödd síðustu táknrænu sprenginguna í grunni meðferðarkjarnans.

Heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, var viðstödd þegar hillir undir lok við sprengivinnu í grunni nýs meðferðarkjarna við Hringbraut. Um er að ræða síðustu táknrænu sprenginguna í grunni meðferðarkjarnans. Jarðvinnu er lokið og uppsteypa við nýtt þjóðarsjúkrahús hefst von bráðar. Nýr meðferðarkjarni er stærsta byggingin í heildaruppbyggingu Nýs Landspítala.

Ráðgjafarnefnd Landspítala skoðar framkvæmdasvæði nýs Landspítala



Fulltrúar úr Ráðgjafarnefnd Landspítala á verkstað með framkvæmdastjóra NLSH

Fulltrúar frá ráðgjafarnefnd Landspítala skoðuðu nýlega framkvæmdir við nýjan Landspítala við Hringbraut.

Framkvæmdastjóri NLSH, Gunnar Svavarsson, kynnti stöðu Hringbrautarverkefnisins með heimsókn á framkvæmdasvæðið.

Framkvæmdir við bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu



Búið er að malbika og að leggja snjóbræðslu í bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu

Breytingum á bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu er að ljúka. Bílastæðið hefur verið malbikað og fljótlega verður steyptur kantstein og bílastæðalínur málaðar.
(Sjá nr. 1 á korti)

Framkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg



Búið er ganga frá hellulögn sunnan við Eirberg,
séð til norðurs



Vinna við yfirborðsfrágang við vesturhlið Eirbergs

Svæðið sunnan og vestan við Eirberg verður klárað fljótlega og einungis á eftir að ganga frá hellulögn. Vinna við yfirborðsfrágang er í gangi.
Lokið hefur verið við gönguleið á milli geðdeildarbyggingar og Eirbergs. Gönguleiðin er með snjóbræðslu.

Áætlað er að þessum framkvæmdum ljúki í júní.

(Sjá nr. 2 á korti)

Frágangur sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala



Verið er að klára að helluleggja við geðdeildarbyggingu Landspítala

Verið er að klára hellulögn við bílastæðin sunnan við geðdeildarbyggingu. Búið er að leggja snjóbræðslu.

Vinna við bílastæði fyrir hreyfihamlaða er hafin. Stæðin verða stækkuð og aðgengi að svæði við geðdeildarbyggingu bætt. Stæðin verða með snjóbræðslu.

(Sjá nr. 3 á korti)

Lokaáfangi jarðvinnu vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg



Vinna við sprengingar í norðaustur horni bílakjallara

Nú hillir undir lok jarðvinnu við grunn bílakjallara. Einungis er eftir sprengivinna í norðaustur horni bílakjallararans.

Bílakjallarinn verður staðsettur undir Sóleyjartorgi austan við meðferðarkjarna.

Áætlað er að jarðvegsframkvæmdum vegna bílakjallara ljúki í júní.

(Sjá nr. 4 á korti)

Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjum meðferðarkjarna



Vinna við grunn meðferðarkjarna er á lokastigi, séð til austurs



Grunnur meðferðarkjarna, séð til norðurs

Vinna við grunn við nýjan meðferðarkjarna er nánast lokið.

Grunnur meðferðarkjarnans er um 200 metrar að lengd og um 100 metrar að breidd.

Öll umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið er vaktað.

(Sjá nr. 5 á korti)

Frágangur við bílastæði norðan við Eirberg



Hellulagning við eyjur norðan við Eirberg mun klárást í júní

Vinna við að helluleggja eyjur er að mestu lokið. Í framhaldi verða málaðar bílastæðalínur norðan við Eirberg.

Stæðin eru gjaldskyld og eru ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra.

Verklok eru áætluð í júní.

(Sjá nr. 6 á korti)

Frágangur við bílastæði vestan við Gamla Landspítala



Búið er að leggja snjóbræðslu í tröppur vestan við Gamla spítala

Frágangi við bílastæði vestan við Landspítala er ekki lokið. Búið er að leggja snjóbræðslu á gönguleið frá bílastæði að Gamla spítala og verður svæðið hellulagt. Bílastæðin hafa verið tekin í notkun. Þau eru ætluð fyrir gesti spítalans og eru gjaldskyld. Verklok eru áætluð í júní.

(Sjá nr. 7 á korti)

Vinnusvæði meðferðarkjarnans, sýnið varúð við akstur




Akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en ökumönum er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.

Akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna

(Sjá nr. 8 á korti)

Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir

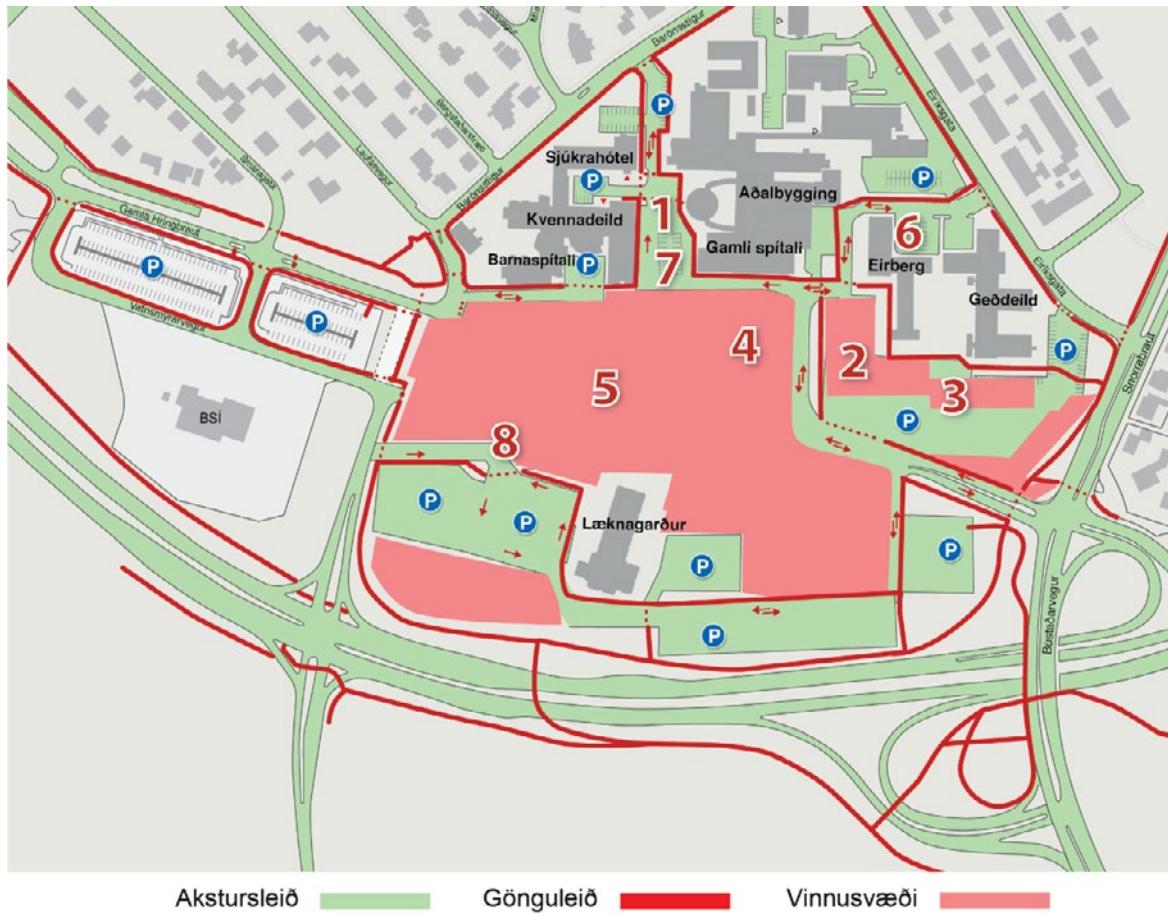

Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH, 866 1378 eða magnus@nlsh.is

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 stefanhh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is



Hringbrautar
verkefnið

nlsh.is

NLSH ohf. / Skúlagata 21, 101 Reykjavík / Aðalnúmer 551 6010 / kt. 500810-0410 / postur@nlsh.is

Höfundaréttur © NLSH ohf.
