




Framkvæmdir við inngarð Barnaspítala, lagnavinna við gamla spítalann, bílastæði við Eirberg, stækkun bílastæða við Læknagarð, framkvæmdir neðan Gömlu Hringbrautar, gróftur fyrir grunni meðferðarkjarna og frestun á lokun Gömlu Hringbrautar til 8. febrúar 2019.

Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

1. Vinna við lagnaskurð við Barnaspítala (sjá nr. 1 á korti)

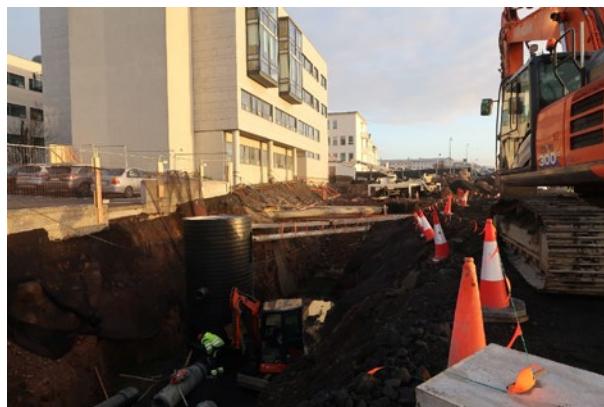

- Allri sprengivinnu er lokið á svæðinu. Unnið er að lagnavinnu og við að fylla í skurðstæði.
- Laufásvegur var opnaður samkvæmt áætlun fyrir jól.
- Vinna við endurgerð gatnamóta Laufaásvegar og Gömlu Hringbrautar hefst fljótega.

2. Framkvæmdir við inngarð Barna- og Kvennadeildar (sjá nr. 2 á korti)



- Vinna heldur áfram fyrir framan inngang Barnaspítalans. Vinna við gröft fyrir tengigöngum og lögnum er lokið.
- Uppsteypun tengiganganna er hafin og mun halda áfram næstu vikurnar.
- Inngangur í Barnaspítala er í gegnum Kvennadeild. Þar er opið kl. 07-22, alla virka daga, og kl. 10-22 um helgar. Utan þess tíma er inngangur á Barnaspítala frá Eiríksgötu. Allar bráðakomur á Barnaspítala eiga eftir sem áður að koma inn um suðurgaflinn á Kvennadeild, allan sólarhringinn.
Þessi nýi inngangur verður í notkun fram í febrúar 2019 þegar gamli aðalinngangurinn opnar aftur.

3. Framkvæmdir við gamla spítalann (sjá nr. 3 á korti)



- Unnið er að dýpkun lagnaskurða og eru það síðustu sprengingarnar á þessu svæði. Búast má við að þeim ljúki í þessari viku.
- Lagnavinna og fyllingar eru nú þegar komnar af stað og munu halda áfram í næstu viku.

4. Lagning stofnæða austan við BSÍ (sjá nr. 4 á korti)



- Unnið er að lagningu heitavatns og kaldavatns stofnæða.
- Þverun á Vatnsmýrarvegi verður á næstu dögum en honum haldið opnum með hjáleið en þó má búast við þrengingu á umferð vegna þessa og eru ökumenn því beðnir um að fara varlega á svæðinu.

5. Framkvæmdir milli Læknagarðs og Hringbrautar (sjá nr. 5 á korti)



- Unnið er að lagnavinnu og að fylla í götustæði.
- Áætlað er að malbika það sem eftir er af Neðstu götu í lok næstu viku ef veður leyfir.

6. Framkvæmdir við grunn meðferðarkjarna (sjá nr. 6 á korti)



- Áframhaldandi vinna við grunn meðferðarkjarnans neðan Gömlu Hringbrautar. Verktakinn hefur hafið uppgröft á lausum jarðvegi í grunni meðferðakjarnans neðan Gömlu Hringbrautar. Losun klappar með sprengingum á svæðinu hófst einnig í vikunni.

7. Lýsing á bílastæðum við BSÍ

- Búið er að setja upp lýsingu við bílastæðin norðan við BSÍ (Bílastæðareitir A og B).

8. Stækkun bílastæðis við Læknagarð

- Búið er að opna stækkun bílastæðis við Læknagarð og er komin lýsing á svæðið.


9. Bílastæði vestan Eirbergs

- Verið er að klára að setja upp lýsingu á bílastæði vestan Eirbergs og ganga þar frá gönguleiðum.

Pær framkvæmdir sem hefjast á næstu mánuðum eru:

10. Stefnt að lokun Gömlu Hringbrautar 8. febrúar 2019 vegna jarðvinnu meðferðarkjarnans.

- Stefnt er að lokun Gömlu Hringbrautar 8.febrúar.
- Lokunin mun ná á milli Laufásvegar og innkeyrslu inn á bílastæði LSH, sem þýðir að áfram verður hægt að aka Gömlu Hringbraut frá Snorrabraut og inn á bílastæði LSH.
- Lokunin hefur í för með sér breytingar á leiðakerfi Strætó bs. Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðinu www.straeto.is.

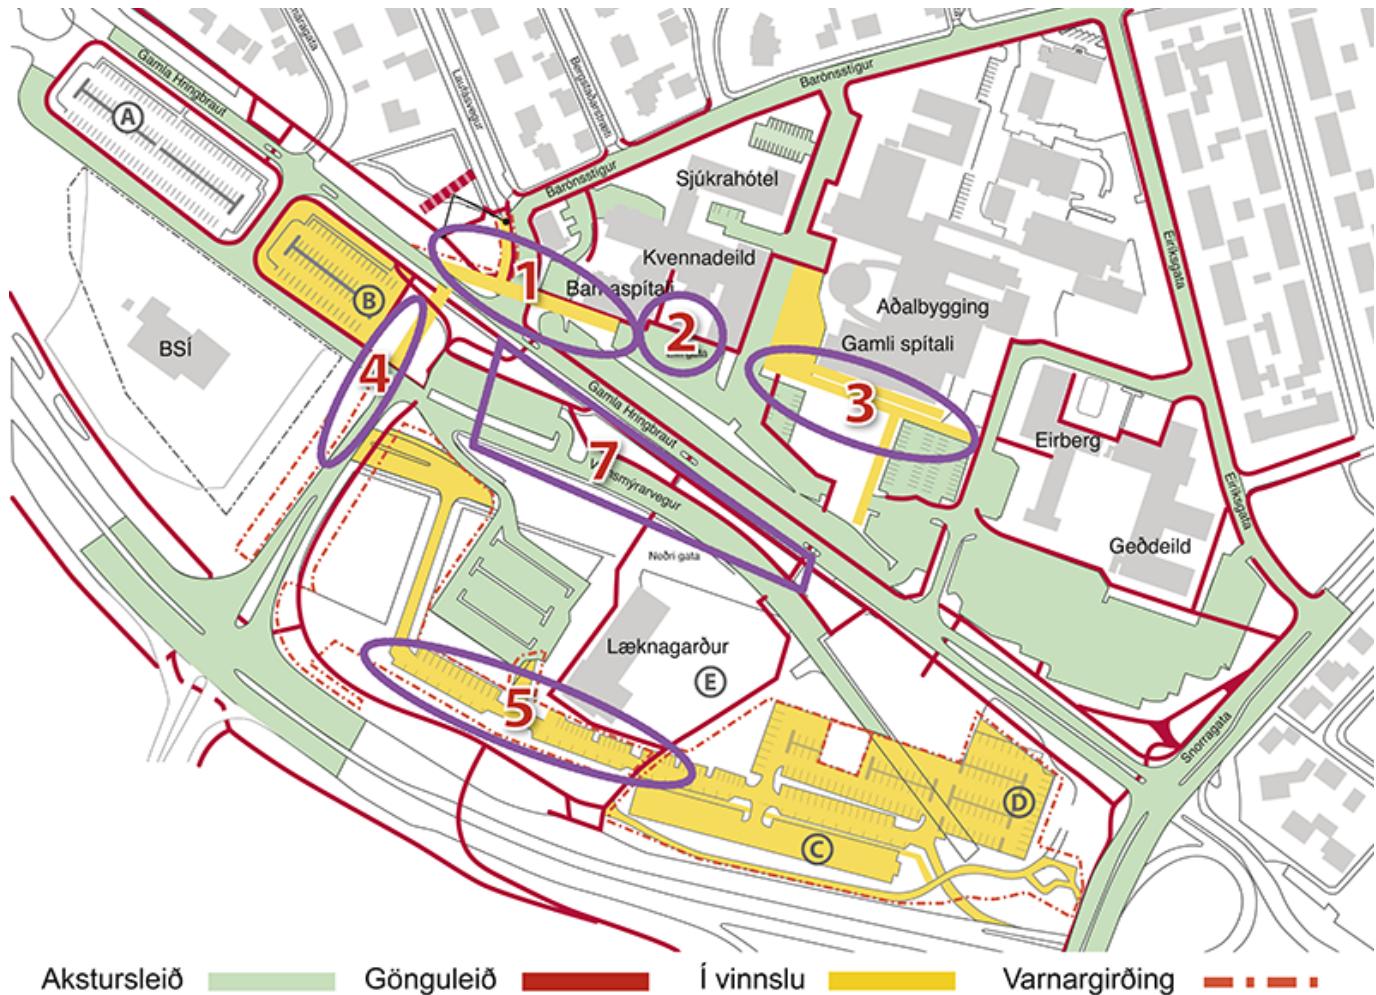

Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjölmöulum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is

Ólafur Birgisson verkefnastjóri FSR, 896 7330 eða netfangið olafur.b@fsr.is

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,

866 1378 eða magnus@nlsh.is.

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
